


## **Relatório de Resultados**

### **4º Período Avaliatório**

01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022



# **EKOS** BRASIL

## **1 – INTRODUÇÃO**

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria 51/2021 no período de 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP.

## 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

**QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS<sup>1</sup>**

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	Resultados
					4º Período Avaliatório 01/10/22 a 31/12/22	
1	Operacionalização e manutenção do PERD	1.1	Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros	15	-	-
		1.2	Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado	15	-	-
2	Fortalecimento da Gestão	2.1	Percentual de atualização dos planos elaborados	15	-	-
		2.2	Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD	10	-	-
		2.3	Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos	10	-	-
		2.4	Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD	10	-	-
5	Fortalecimento de Pesquisas	5.1	Número acumulado de exsicatas indexadas	10	375	375
		5.2	Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD	15	-	-

<sup>1</sup> Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”.

## 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados

<b>Área Temática</b>	05 Fortalecimento de Pesquisas
<b>Indicador</b>	5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas
<b>Meta</b>	375 Exsicatas Indexadas
<b>Resultado</b>	375 Exsicatas Indexadas

A meta do indicador “5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas” para o 4º Período Avaliatório foi cumprida pelo Instituto Ekos Brasil, com a indexação das 375 exsicatas previstas para o período. O relatório comprobatório foi enviado para o IEF em 05 de dezembro de 2022 e validado pela instituição em 16 de dezembro de 2022.

Além da meta do indicador, foram identificadas necessidades de aquisições de equipamentos para melhor funcionamento do herbário do PERD. Essas demandas foram compartilhadas com o órgão gestor do PERD em 13 de outubro de 2022. Em 26 de outubro de 2022 o pedido de compras destes equipamentos foi formalizado pelo IEF.

Os equipamentos adquiridos foram o freezer, estufa, desumidificador, ar-condicionado e lupa (microscópio estereoscópio). Foram também realizadas as compras de insumos para o funcionamento do herbário. Somado aos insumos e equipamentos, o herbário do PERD foi veiculado ao Jabot, software de indexação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e passará a incorporar as novas exsicatas indexadas através desta plataforma, substituindo o antigo software (BRAHMS).

A partir dessa reestruturação, o herbário do PERD conta com os recursos necessários para ampliação de sua coleção botânica, bem como para receber adequadamente pesquisadores(as) de flora para utilizar sua estrutura.

Especificamente sobre a coleção botânica, sua composição foi minuciosamente avaliada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. Identificou-se que não há 2000 exsicatas na coleção atual, conforme indicado no Termo de Parceria, mas sim 1390, ou seja, 610 a menos do que estava posto como passivo a ser incorporado

pela OSCIP ao herbário do PERD. Desse modo, recomenda-se avaliação conjunta sobre a meta do indicador 5.1. de Indexação de Exsicatas.

Para criar um procedimento de contínua ampliação da coleção botânica do herbário, ampliar sua visibilidade e visibilidade do Parque, foi construído nesse quarto trimestre um reposicionamento da missão do herbário. Foram elencados os critérios para ampliação da coleção, bem como estratégias de parcerias a serem estabelecidas com outras instituições. Foi feito um inventário das Instituições de Ensino Superior (IES) da região que são potenciais parceiras e dos herbários que poderão doar duplicatas de exsicatas ao herbário do PERD. Além deste olhar estratégico, foi obtido pelo Instituto Ekos Brasil a licença para coleta de espécimes vegetais dentro do Parque para que a composição do herbário seja ampliada. As propostas de reposicionamento e parcerias foram enviadas ao IEF em 23 de dezembro de 2022 e recomenda-se uma reunião sobre o tema na segunda quinzena de janeiro de 2023 para elaboração de um plano de trabalho.

### 3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

**QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS**

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status	
2 Fortalecimento da Gestão	2.1	2	30/06/2022	30/06/2022	Produto Entregue e Aprovado pelo IEF em 30/06/2022	
	2.2	Elaborar Plano de Manejo	1	30/09/2022	28/09/2022	Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo Entregue e Aprovado pelo IEF em 28/09/2022
			3	30/04/2023	-	Não se aplica
			3	30/11/2023	-	Não se aplica
	2.3	Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	1	31/05/2023	-	Não se aplica
			2	30/09/2023	-	Não se aplica
			2	30/06/2025	-	Não se aplica
			2	30/09/2025	-	Não se aplica
			1	20/12/2025	-	Não se aplica
	2.4	Elaborar Plano de Sustentabilidade Financeira do PERD	1	31/08/2023	-	Não se aplica
			7	31/03/2024	-	Não se aplica
	2.5	Estruturar pleito de reconhecimento do PERD como sítio do patrimônio mundial natural da humanidade pela UNESCO	4	31/08/2024	-	Não se aplica

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status	
3	3.1	Elaborar Plano de Uso Público	0,5	31/12/2023	-	Não se aplica
			4	30/06/2024	-	Não se aplica
			0,5	31/08/2024	-	Não se aplica
			3	31/12/2024	-	Não se aplica
	3.2	Implantar Torre de Observação	2	31/10/2023	-	Não se aplica
			2	31/01/2024	-	Não se aplica
4			30/11/2024	-	Não se aplica	
4	4.1	Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	1	31/05/2023	-	Não se aplica
			2	31/08/2023	-	Não se aplica
			3	31/12/2023	-	Não se aplica
			1	31/01/2024	-	Não se aplica
	4.2	Implantar sistema de videovigilância	3	31/03/2024	-	Não se aplica
			2	31/05/2024	-	Não se aplica
			3	30/11/2024	-	Não se aplica

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
5	Fortalecimento de pesquisas	5.1	Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	1	30/06/2023	-	Não se aplica
				3	31/01/2024	-	Não se aplica
				5	30/11/2024	-	Não se aplica
6	Fortalecimento da comunicação	6.1	Elaborar Plano de Comunicação e <i>Marketing</i>	1	31/07/2024	-	Não se aplica
				2	31/10/2024	-	Não se aplica
				3	31/01/2025	-	Não se aplica
		6.2	Elaborar portfólio de produtos de comunicação e <i>marketing</i>	8	31/07/2025	-	Não se aplica
7	Regularização fundiária do PERD	7.1	Elaborar de plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	1	31/03/2023	-	Não se aplica
		7.2	Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF	5	31/12/2023	-	Não se aplica
				2	31/08/2024	-	Não se aplica
		7.3	Produção e juntada de documentos para a regularização fundiária de duas áreas de ampliação do PERD	5	31/12/2023	-	Não se aplica
		7.4	Estudo de georreferenciamento para retificação e ampliação dos limites do PERD	2	31/07/2024	-	Não se aplica
				2	30/11/2024	-	Não se aplica



### 3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

<b>Área Temática</b>	-
<b>Produto</b>	-
<b>Previsão de Término</b>	-
<b>Término Realizado</b>	-
<b>Status</b>	-

Não há produtos previstos para o 4º Período Avaliatório.

## 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE

### 4.1. Administrativo e financeiro


#### 4.1.1. Contratações

Durante o 4º Período Avaliatório o Instituto Ekos concluiu três processos seletivos para novas contratações locais. Os editais dos processos de seleção foram disponibilizados no site do Instituto Ekos em 05 de setembro de 2022, conforme Regulamento de Compras e Contratações (RCC). Os(as) contratados(as) pelos processos seletivos foram 05 agentes de serviço de parque (edital 11/2022); 01 auxiliar de serviços gerais (edital 12/2022); e 01 assistente administrativa (edital 13/2022). Após a conclusão de todas as etapas dos processos de seleção, os(as) colaboradores(as) aprovados(as) iniciaram sua atuação no Parque em 01 de dezembro de 2022.

#### 4.1.2. Aquisição de Materiais e Bens Permanentes


No 4º Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demanda e entendimento comum do Instituto Estadual de Florestas e Instituto Ekos Brasil. A Figura 1 apresenta as aquisições concluídas no 4º trimestre para a Área Temática 1 (AT1 - Operacionalização e Manutenção) e a Figura 2 apresenta as aquisições realizadas para a Área Temática 5 (AT5 - Fortalecimento da Pesquisa).

Figura 1. Aquisições do 4º Período Avaliatório. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção.

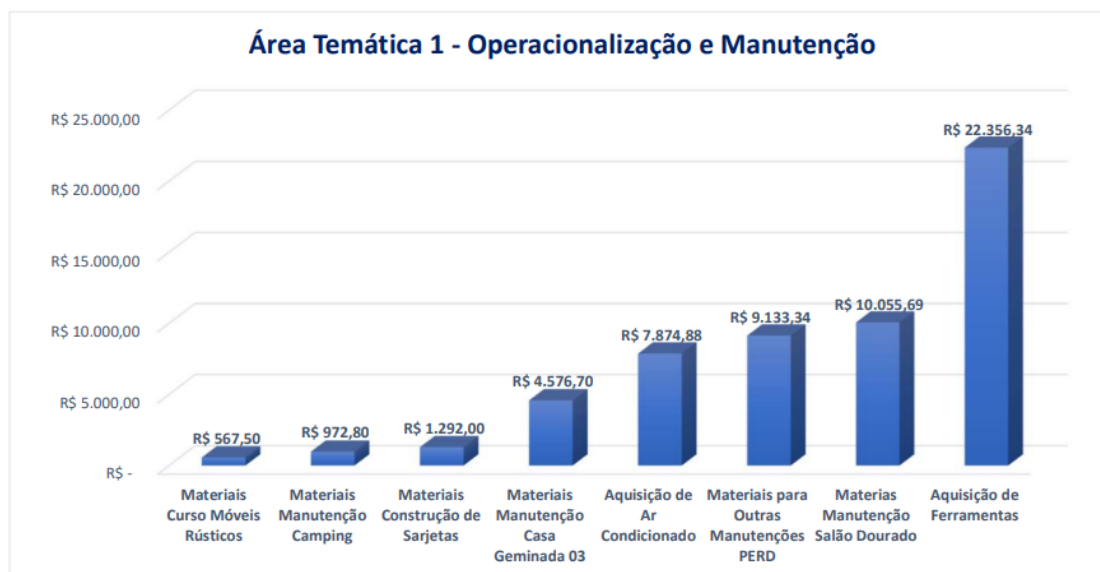

Elaborado pelos(as) autores(as).

Figura 2. Aquisições do 4º Período Avaliatório. Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa.



Elaborado pelos(as) autores(as).

As aquisições realizadas para a AT1 somaram o total de R\$ 56.829,25 e as aquisições realizadas para a AT5 somaram o total de R\$ 17.072,05.

Em 01 de dezembro de 2022 foi divulgado no site do Instituto Ekos Brasil o Edital de Seleção Pública 02/2022 para aquisição de veículo para apoio ao TP 51/2021. O Edital está em processo de análise das propostas recebidas, com previsão de encerramento no próximo Período Avaliatório.

Todas as aquisições de materiais, bens e equipamentos seguiram as normas estabelecidas no RCC do Instituto Ekos Brasil.

## 4.2. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção

### 4.2.1. Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros

Durante o período chuvoso não há previsão de manutenção e ampliação de aceiros no Parque, entretanto, durante esse trimestre o Instituto Ekos deu continuidade no monitoramento da proposta submetida na Plataforma Semente com objetivo de captação de novos recursos para o indicador “manutenção e ampliação dos aceiros”.

#### 4.2.2. Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD

O Termo de Parceria agregou agilidade na execução das atividades de manutenção do PERD. Abaixo o Quadro 1 apresenta as entregas das atividades de manutenção para consolidação do PERD no referente período. Após o quadro, há um gráfico contabilizando as entregas por tipo de manutenção executada (Figura 3).

Quadro 1. Atividades de manutenção para consolidação do PERD.


<b>Demanda</b>	<b>Tipo de manutenção</b>	<b>Característica</b>	<b>Data início</b>	<b>Data fim</b>	<b>Status</b>
Retirada de folhas da área de camping	Limpeza	Planejado	03/10/2022	03/10/2022	Finalizado
Substituição de lâmpadas da área de camping	Elétrica	Planejado	03/10/2022	03/10/2022	Finalizado
Coleta de lixo em áreas do PERD	Limpeza	Planejado	03/10/2022	03/10/2022	Finalizado
Reparo do chuveiro do centro de pesquisa	Hidráulica	Emergencial	05/10/2022	05/10/2022	Finalizado
Reforma elétrica da sala de reunião da administração	Elétrica	Planejado	04/10/2022	07/10/2022	Finalizado
Coleta do lixo e separação em área do PERD	Limpeza	Planejado	07/10/2022	07/10/2022	Finalizado
Reparo dos drenos de água do aceiro próximo à administração	Construção	Planejado	08/10/2022	08/10/2022	Finalizado
Desobstrução da estrada de acesso à fazenda Ganho	Retirada de vegetação	Planejado	09/10/2022	09/10/2022	Finalizado
Limpeza de área de 200 metros para uso dos pescadores	Retirada de vegetação	Planejado	04/10/2022	10/10/2022	Finalizado
Retiradas de folhas da área de camping	Limpeza	Planejado	10/10/2022	10/10/2022	Finalizado
Coleta e separação do lixo na área do PERD	Limpeza	Planejado	10/10/2022	10/10/2022	Finalizado
Retirada de folhas das calhas da portaria e administração	Limpeza	Planejado	10/10/2022	11/10/2022	Finalizado
Limpeza da estrada de acesso fazenda Ganho	Retirada de vegetação	Planejado	18/10/2022	18/10/2022	Finalizado
Limpeza da trilha da campolina	Retirada de vegetação	Planejado	19/10/2022	19/10/2022	Finalizado
Transporte de arquivos do telecentro para o Recanto Verde	Limpeza	Planejado	19/10/2022	19/10/2022	Finalizado
Reparo e limpezas das caixas d'água dos blocos 01,02 e 03 do campo de pouso	Hidráulica	Emergencial	20/10/2022	20/10/2022	Finalizado

Reparos em ventiladores e substituição de lâmpadas queimadas nos alojamentos (centro de pesquisa)	Elétrica	Planejado	24/10/2022	26/10/2022	Finalizado
Estações de refletores na área de camping	Elétrica	Planejado	27/09/2022	27/10/2022	Finalizado
Construir ponto de observação Garrincha	Construção	Planejado	01/11/2022	02/11/2022	Finalizado
Construir ponto de observação Morro do Gavião	Construção	Planejado	02/11/2022	04/11/2022	Finalizado
Construção de dois pontos de monitoramento Garrincha e Morro do Gavião	Construção	Planejado	01/11/2022	04/11/2022	Finalizado
Chuveiro para casa de tábuas	Hidráulica	Emergencial	11/11/2022	11/11/2022	Finalizado
Reparo do ventilador do centro de treinamento e alojamento.	Conserto	Emergencial	11/11/2022	11/11/2022	Finalizado
Recolocação do mangote da bomba da caixa d'água do mirante	Hidráulica	Emergencial	14/11/2022	14/11/2022	Finalizado
Bomba hidráulica para abastecimento	Hidráulica	Emergencial	19/09/2022	21/11/2022	Finalizado
Confecção de placa	Marcenaria	Planejado	21/11/2022	23/11/2022	Finalizado
Retirada de vegetação do intertravado, próximo à portaria	Retirada de vegetação	Planejado	28/11/2022	28/11/2022	Finalizado
Manutenção da caixa de esgoto e desentupimento no campo de pouso	Hidráulica	Emergencial	26/11/2022	30/11/2022	Finalizado
Desdobra de madeira mesa e bancos para pescadores	Marcenaria	Planejado	21/11/2022	30/11/2022	Finalizado
Roçada do campo de pouso	Retirada de vegetação	Planejado	29/11/2022	01/12/2022	Finalizado
Retirada de vegetação área de camping	Retirada de vegetação	Planejado	07/12/2022	08/12/2022	Finalizado
Montagem de equipamentos para poda de grama	Instalação	Planejado	14/12/2022	14/12/2022	Finalizado
Escoria do hangar	Instalação	Planejado	14/12/2022	16/12/2022	Finalizado
Troca de resistência do chuveiro e substituição de torneiras da cozinha no bloco 3, campo de pouso	Reforma mista	Emergencial	20/12/2022	20/12/2022	Finalizado
Aplicação de impermeabilizante na calha da sala do segundo andar da administração	Alvenaria	Emergencial	21/12/2022	21/12/2022	Finalizado
Retirada de grama do viveiro e plantação no bosque da prainha da Lagoa do Bispo	Jardinagem	Planejado	21/12/2022	21/12/2022	Finalizado

Adequação de instalação elétrica para receber o freezer do herbário	Instalação	Planejado	20/12/2022	21/12/2022	Finalizado
Apoio a desocupação da sala no laboratório de pesquisa	Limpeza	Planejado	20/12/2022	21/12/2022	Finalizado
Manutenção da calha na administração	Conserto	Planejado	21/12/2022	21/12/2022	Finalizado
Retirada de goteira na casa de tábuas	Conserto	Planejado	22/12/2022	22/12/2022	Finalizado
Limpeza da canaleta da casa de tábuas	Retirada de vegetação	Planejado	22/12/2022	22/12/2022	Finalizado
Retirada da vegetação da margem da principal via de acesso	Retirada de vegetação	Planejado	10/12/2022	22/12/2022	Finalizado
Retirada de vegetação e reforma da estrutura do portal da trilha do vinhático	Reforma mista	Planejado	27/12/2022	28/12/2022	Finalizado
Retirada de vegetação da ecovila	Retirada de vegetação	Planejado	07/12/2022	29/12/2022	Finalizado
Construção de mesas para visitantes na área de banho	Alvenaria	Planejado	21/12/2022	29/12/2022	Finalizado
Renovação de toda estrutura da rede elétrica e a sua ligação ao novo padrão elétrico da casa geminada 3	Elétrica	Planejado	22/12/2022	02/01/2023	Finalizado
Pintura da casa geminada 3	Reforma mista	Planejado	10/10/2022		Andamento
Limpeza da estrada da preguiça	Retirada de vegetação	Planejado	02/11/2022		Andamento
Manutenção da casa da OSCIP	Alvenaria	Planejado	01/12/2022		Andamento
Pintura da casa geminada 3	Conserto	Planejado	20/12/2022		Andamento

Elaborado pelos(as) autores(as).

Figura 3. Quantificação dos diferentes tipos de manutenção

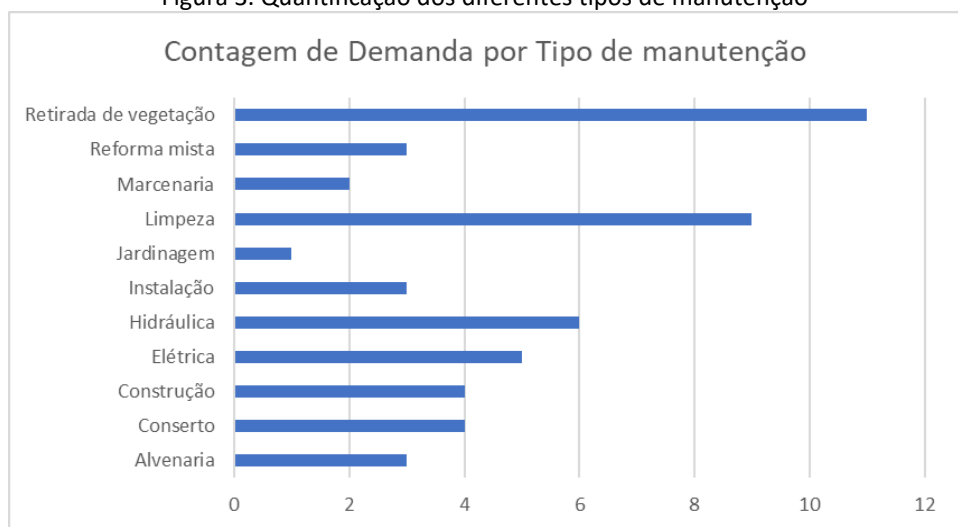

Elaborado pelos(as) autores(as).

#### **4.2.3. Fornecimento mensal de internet no PERD**

No mês de dezembro foi encerrado o processo de contratação para fornecimento de link dedicado de internet na Sede Administrativa e no Centro de Treinamento do Parque. A empresa vencedora do processo de solicitação de propostas foi a NET VALE.

### **4.3. Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão**

#### **4.3.1. Revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento (ZA) do Parque Estadual do Rio Doce**

Após aprovação, em 28/09/2022, do Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo do PERD e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental de sua Zona de Amortecimento, o Comitê Técnico (Instituto Ekos e IEF) e a Plantuc iniciaram o planejamento e a execução da próxima etapa de trabalho “Consolidação das informações e Reconhecimento de campo”. Esta etapa envolve a realização de reuniões de planejamento, o reconhecimento de campo, a apresentação dos trabalhos ao Conselho Consultivo, e a elaboração da Caracterização da UC, Diagnóstico da ZA, Banco de Dados e Material Cartográfico.

Conforme mencionado no relatório do Período Avaliatório anterior, no dia 07 de outubro de 2022, o Comitê Técnico realizou uma apresentação sobre o andamento dos trabalhos de revisão do Plano de Manejo do PERD e elaboração do Diagnóstico da ZA durante o II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD. Na oportunidade foi possível esclarecer dúvidas e coletar contribuições dos(as) pesquisadores(as) presentes, assim como solicitar o envio de informações sobre os projetos de pesquisa em andamento no Parque.

Entre os dias 18 e 20 de outubro de 2022 as equipes Ekos, IEF e Plantuc realizaram a primeira etapa de reconhecimento de campo da Unidade, percorrendo as áreas norte, sul, leste e oeste do Parque, além de pontos estratégicos de sua ZA. A atividade incluiu o reconhecimento do estado de conservação da unidade; das estruturas de uso público, de pesquisa, de administração e fiscalização; de regiões da zona de amortecimento; e das trilhas e atrativos do PERD, como a trilha da campolina, a estrada do Salão Dourado, a Ponte Queimada, a Ponte Perdida e outros. No dia 21 de

outubro o Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo foi apresentado e discutido em reunião do Conselho Consultivo do PERD.

Nos dias 08 e 09 de novembro a equipe se reuniu novamente no Parque para avaliar conjuntamente a efetividade da gestão do PERD. Nesta segunda etapa do reconhecimento de campo as equipes puderam avaliar as diferentes ferramentas de gestão utilizadas pela UC, assim como realizar o preenchimento conjunto do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) do Parque referente ao ano de 2022.

No dia 01 de dezembro foi realizada uma reunião de trabalho com as equipes envolvidas com o processo de concessão do PERD (IEF e BNDES) e a equipe envolvida com a revisão do Plano de Manejo, para apresentar os dois processos discutir os limites e sinergias entre o que se fará no Plano de Manejo e o que se vislumbra para a Concessão.

Entre os dias 06 e 09 de dezembro, a consultoria Plantuc conduziu atividade de campo específica para captura de imagens por drone da Unidade e ZA. A atividade foi planejada conjuntamente com o Comitê Técnico e teve como objetivos realizar um sobrevoo exploratório, de maneira a multiplicar os esforços de reconhecimento das áreas. Foi possível verificar pontos específicos considerados críticos pela gestão da UC, especialmente ocupações que exercem algum tipo de pressão sob o Parque ou ZA, e capturar imagens cênicas da Unidade que poderão ser utilizadas futuramente nas ações de consolidação do PERD.

Durante todo o Período Avaliatório, e tendo como referência os materiais secundários disponibilizados pelo Comitê Técnico e as atividades mencionadas acima, a consultoria Plantuc conduziu a elaboração da Caracterização da UC, do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da ZA, do Banco de Dados Geográficos. Os produtos acima, juntamente com o relatório e imagens obtidas pelo sobrevoo de drone, foram entregues no dia 23 de dezembro de 2022, conforme cronograma estabelecido entre o Comitê Técnico e Plantuc, aprovado em Plano de Trabalho. Os produtos passarão por



fluxo de análise e revisão pelo Comitê Técnico, sendo que a versão final dos documentos deverá ser aprovada pelo IEF até o dia 17 de fevereiro de 2023.

Durante o mês de dezembro, a equipe do Comitê Técnico sistematizou e analisou todas as ações previstas no Plano de Manejo do PERD aprovado em 2003, no Plano de Uso Público de 2005 e no Plano Operativo Anual de 2022. As ações foram avaliadas quanto aos graus de execução e relevância. Tal análise deverá ser incorporada na revisão do Plano de Manejo da UC e nas ações de consolidação previstas no Termo de Parceria.

Em 14 de dezembro de 2022, o Comitê Técnico e Plantuc realizaram uma reunião de planejamento dos próximos passos para o ano de 2023, envolvendo o planejamento das 4 reuniões preparatórias e da Oficina de Revisão do Plano de Manejo. As atividades acontecerão conforme calendário apresentado abaixo:

- 30/01/2023: Reunião preparatória em Cava Grande;
- 01/02/2023: Reunião preparatória em Pingo D'Água;
- 03/02/2023: Reunião preparatória em Timóteo;
- 09/02/2023: Reunião preparatória com as Prefeituras do entorno;
- 10/02/2023: Participação da equipe em reunião de posse do novo Conselho Consultivo do PERD;
- 03 a 06/04/2023: Oficina de Revisão do Plano de Manejo.

Para o próximo Período Avaliatório está previsto o deslocamento e imersão dos coordenadores(as) técnicos(as) no Parque durante 4 semanas para acompanhamento e condução da continuidade dos trabalhos.

#### ***4.3.2. Demais atividades de apoio à Gestão do Parque***

Durante o 4º Período Avaliatório a equipe Ekos Brasil apoiou a Gestão do PERD em diferentes demandas para apoio às ações de consolidação da UC.

Entre os meses de novembro e dezembro de 2022 foram compilados todos os dados referentes à aplicação do ICMS Ecológico para os municípios de Dionísio, Timóteo e

Marliéria relacionados ao Parque entre os anos de 2016 e 2022. Tal informação foi incorporada ao Painel de Gestão da Unidade.

Também a partir do mês de novembro de 2022, a equipe do Termo de Parceria passou a apoiar a organização das planilhas internas de controle de visitas e agendamento de uso das casas institucionais da UC.

No dia 30 de novembro de 2022 a equipe acompanhou o fechamento do projeto Quintais Produtivos, do Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal BioFlorestas.

No mês de dezembro de 2022 foram compilados os dados de formulário sobre o uso da estrada do Salão Dourado aplicado junto aos(às) usuários(as) da via por funcionários do IEF. Os dados foram compilados em relatório, que passa por revisão interna e finalização prevista para janeiro de 2023.

Durante o Período Avaliatório foi elaborada nova proposta de reorganização da apresentação geral do PERD realizada pelos guardas-parque para os diferentes públicos durante visitas à Unidade. A apresentação foi reformulada, com atualização de fotos e informações a serem repassadas ao público em geral. A proposta de apresentação está sob revisão pela equipe de Gestão da UC.

Em 06 de dezembro de 2022 a equipe do Termo de Parceria apoiou a realização do Natal Solidário, com vistas a promover a integração com a sociedade do entorno ao PERD, por meio da participação em atividades lúdicas e doação de presentes pelo Instituto Ekos para a Escola Municipal Marciano Felisberto Pinto.

Com o objetivo de multiplicar o conhecimento e promover a capacitação dos colaboradores do Parque, a equipe acompanhou e apoiou a execução do Curso de Condutores de Turismo realizado no PERD entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2022, além de apoiar a Gestão da UC com a confecção dos certificados para os(as) participantes.

#### **4.4. Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa**

##### ***4.4.1. Apoio ao II Seminário de Pesquisas Integradas – Unidos Pelo PERD***

Conforme apontado no Relatório de Resultados do 3º Período Avaliatório, o Termo de Parceria apoiou a execução do “II Seminário de Pesquisas Integradas – Unidos Pelo PERD” que aconteceu nos dias 06 e 07 de outubro. A equipe do Instituto Ekos apresentou o escopo do Termo de Parceria aos(as) participantes, colaborou nas atividades do encontro e o Termo de Parceria custeou integralmente os serviços de alimentação do Seminário.

##### ***4.4.2. Captação de recursos – INCT-HVF&F (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos)***

No 4º Período Avaliatório, adquiriu-se uma impressora multifuncional com recursos disponibilizados pelo INCT-HVF&F e captados por meio do Termo de Parceria. A equipe do Instituto Ekos fez o trâmite necessário para solicitação dos recursos e obteve a autorização de compra do equipamento, que foi entregue na sede do PERD e está no herbário.

Em 30 de novembro de 2022 foi comunicado ao IEF a captação e pedido a validação dessa iniciativa para o indicador “2.3 - Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos”, da Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão. Em 16 de dezembro de 2022 o IEF respondeu que essa validação está sob avaliação.

##### ***4.4.3. Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD***

A Área Temática 5 – Fortalecimento de Pesquisa, tem como um de seus indicadores o número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD. No atual cronograma do TP, esse indicador terá suas atividades iniciadas em janeiro de 2024. No entanto, por mostrar-se como uma demanda complexa, iniciou-se em 2022 a discussão sobre a execução do indicador.

Em 03 de novembro de 2022 foi realizada uma reunião com especialista em biblioteconomia formado pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) que sinalizou alguns pontos de atenção para execução do indicador. Dentre eles, a

necessidade de um(a) bibliotecário(a) responsável por essa unidade de informação que será construída. Após alinhamento com o IEF, iniciou-se o diálogo com a biblioteca do SISEMA para avaliar como a estrutura e recursos da biblioteca pode apoiar o Termo de Parceria.

Em 23 de dezembro de 2022 foi realizada uma reunião com a biblioteca do SISEMA e estão agendadas reuniões com a equipe de Tecnologia da Informação e Biblioteca do SISEMA para fevereiro de 2023. A intenção é que ao longo deste ano esses alinhamentos sejam construídos para que a plataforma de acesso às pesquisas do PERD esteja de acordo com as normas da biblioteconomia sobre organização e disponibilização de informações.

#### ***4.4.4. Colaboração com os pesquisadores(as) do PERD***

No dia 06/12/2022 foi fornecido apoio aos(as) estudantes da UFMG (Laboratório de Limnologia) para limpeza e organização do Laboratório utilizado pelo projeto Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD).

Além desta ação, foram realizados diálogos com os(as) pesquisadores(as), quando se encontram no Parque, para um melhor entendimento das pesquisas em desenvolvimento; esclarecimento de orientações gerais (como o de disponibilidade das casas institucionais e acompanhamento de barcos nas lagoas com motorista náutico); demais acordos que foram firmados no II Seminário de Pesquisas Integradas; e para entender como pode-se apoiar essas pesquisas.

#### ***4.4.5. Ações administrativas em apoio ao fortalecimento da pesquisa***

Especificamente sobre a área de flora, foi dado suporte para elaboração de tabela sobre as famílias botânicas presentes no Herbário do PERD para compor o Painel de Gestão. Foi realizado o apoio na construção do texto sobre flora para compor a revisão do Plano de Manejo e realizado o apoio com informações associadas à flora na Nota Técnica referente à Ponte Queimada e Estrada do Salão Dourado.

Foi iniciada a compilação das normas sobre a execução de pesquisas em Unidades de Conservação, para compor o Procedimento Operacional Padrão (POP) de Pesquisa do PERD, sistematizando as informações necessárias para que funcionários(as) e pesquisadores(as) possam compreender exigências e demandas sobre autorizações, prazos, entregas e apoios.

#### **4.5. Área Temática 7 – Regularização Fundiária**

##### ***4.5.1. Análise documental para retificação e regularização da Matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF***

Durante o Período Avaliatório foi realizada a análise de diversos documentos disponibilizados pelo IEF, tais como:

- Certidão de Inteiro Teor Matrícula 49.462;
- Certidão de Inteiro Teor Matrícula R.1-6.897;
- Representação cartográfica comparativa entre a área do memorial descritivo da Matrícula R.1-6.897 com o perímetro do SISEMA;
- Representação cartográfica do deslocamento da projeção do Parque;
- Projeção cartográfica do memorial descritivo sobre o perímetro ocupado pelo PERD;
- Limite oficial do PERD IDE-SISEMA.

Além dos documentos fornecidos pelo IEF, foram localizados e analisados os seguintes documentos:

- Decreto com numeração especial nº 147/2015;
- Levantamento topográfico do perímetro do Parque de 1975.

De acordo com a análise desses documentos foi elaborado o “Relatório Técnico de Análise Documental – Retificação de Matrícula do Parque Estadual do Rio Doce”, enviado em 20 de dezembro de 2022 ao IEF, o qual apresenta recomendações técnicas para elaboração do Plano de Trabalho para regularização fundiária do Parque.

## **4.6. Demais atividades para Consolidação do PERD**

### **4.6.1. Estratégias de comunicação**

Com o objetivo de incrementar as ações de visibilidade do Parque, foi elaborado pelo Instituto Ekos Brasil uma proposta de estratégias de comunicação para o indicador de visibilidade da Área Temática 02. As estratégias contemplam uma regularidade de postagens nas redes sociais do Instituto Ekos sobre os trabalhos realizados no Termo de Parceria, bem como uma proposta comercial de criação de identidade visual para o TP e reformulação da identidade visual do PERD. A estruturação dessas estratégias de comunicação e visibilidade está em processo de amadurecimento pelas instituições parceiras e deverão ser delineadas ao longo dos próximos Períodos Avaliatórios.

Além da construção de estratégias de comunicação para visibilidade do PERD, a partir de outubro de 2022, após solicitação da equipe de Gestão da UC, a equipe local passou a acompanhar e contribuir com publicações nas mídias sociais do Parque.

### **4.6.2. Início da elaboração do diagnóstico sobre o Viveiro de Mudas**

Na segunda quinzena de dezembro foram iniciadas as conversas com os(as) colaboradores(as) que trabalham no viveiro de mudas do PERD e em outras áreas do Parque. Essa coleta de dados subsidiará a elaboração do diagnóstico e histórico do local. Esse documento norteará a elaboração de estratégias para reorganização do viveiro, em alinhamento com as ações de consolidação do PERD.

### **4.6.3. Workshop**

Nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 foi realizado no Centro de Treinamento do PERD o 1º Workshop do Termo de Parceria. A partir dos temas discutidos e encaminhamentos acordados entre os participantes, foi iniciada a elaboração de um plano de trabalho com o objetivo de desenvolver ações em 4 macro temas, nas áreas de estratégias do Termo de Parceria; modelo de parceria atual e relação com atores externos; estrutura organizacional do Termo de Parceria; e ações de consolidação do PERD.

As ações visam fortalecer a comunicação e a integração entre as equipes, desenvolver a capacitação de pessoas e estratégias que contribuam para o fortalecimento da implantação das ações de consolidação do PERD.

Foi compreendido pelos participantes que o evento foi bastante positivo e contribuiu significativamente para melhor entendimento e esclarecimentos de alguns temas e alinhamento entre a equipe do Termo de Parceria para o alcance das ações de consolidação do PERD. Para o ano de 2023 será agendado novo workshop em data a ser avaliada.

## **5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A entrega prevista para o 4º Período Avaliatório (indexação de exsicatas) foi realizada dentro do prazo. Evidenciou-se que a quantidade total de exsicatas referida no Termo de Parceria (2000) não é o que de fato existe no herbário (1390). Recomenda-se a avaliação conjunta sobre a meta do indicador 5.1. de Indexação de Exsicatas.

Neste Período Avaliatório foi ampliado o quadro de funcionários do Termo de Parceria. Atualmente a equipe do TP conta com 17 colaboradores(as). Destaca-se que as compras estão acontecendo de acordo com o RCC.

Em relação à Área Temática 1, o Termo de Parceria proporcionou ao PERD aporte significativo na operacionalização e manutenção das estruturas do Parque.

A Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão, segue avançando no processo de revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento, cumprindo o cronograma estabelecido em Plano de Trabalho. Além da elaboração do produto em andamento, outras ações estão sendo conduzidas, conforme demanda para apoio à Gestão da UC.

Sobre as atividades da Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa, adiantou-se a discussão do indicador de banco de dados, como uma forma de construir essa entrega com a colaboração de outras instâncias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais.

Na Área Temática 7, por meio da análise documental realizada relativa à retificação da matrícula R.1-6.897, houve melhor entendimento da atual questão fundiária da UC. Foram apresentadas recomendações técnicas para elaboração de Plano de Trabalho para estabelecer diretrizes na elaboração dos produtos indicados no Termo de Parceria.

Adicionalmente, foram realizadas atividades que convergem para o apoio às ações de consolidação do PERD, que não estão diretamente ligadas aos produtos e indicadores



do Termo de Parceria, mas que são importantes ao PERD. Tais atividades contaram com o apoio da equipe do Termo de Parceria.

Por fim, destaca-se que o Workshop realizado em dezembro foi frutífero para a avaliação do primeiro ano de execução do Termo de Parceria e alinhamentos de toda a equipe do Termo de Parceria para a implementação das ações de consolidação do PERD no prazo estabelecido.


## **6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

Em anexo todos os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e as certidões atualizadas.

## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS BRASIL e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2023.



Diretora Presidente do Instituto Ekos Brasil
